

Program & Project Management

Program

Program merupakan kumpulan proyek, sub-program dan aktivitas terkait yang dikelola secara terkoordinasi dengan tujuan memperoleh manfaat yang tidak bisa dicapai jika dikelola terpisah.

Tujuan :

1. Menghasilkan manfaat(benefits) bagi organisasi
2. Menyelaraskan strategi, rencana kerja, hasil proyek
3. Mendukung perubahan, peningkatan kapabilitas, pemeliharaan aset, produk atau layanan baru dan peluang baru untuk menciptakan atau menjaga nilai

Deliverable : Proyek dan Sub-Program

Deliverable adalah produk, hasil, atau layanan yang dapat diverifikasi untuk menyelesaikan proses, fase, atau project



Program Life Cycle

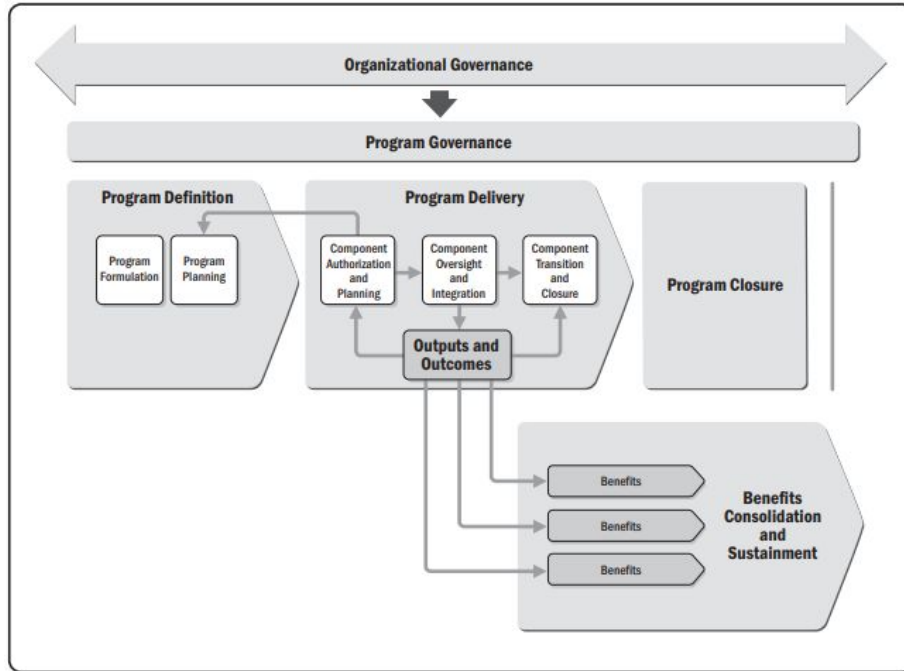


Figure 1-1. Program Life Cycle

Program dikelola harus selaras dengan strategi dan kebijakan organisasi.

Program Definition tahap untuk perumusan dan perencanaan program

Program Delivery tahap untuk mengkoordinasikan berbagai proyek dan sub-program. Pelaksanaan program menghasilkan **output dan outcome** yang menjadi manfaat bagi organisasi.

Program Closure setelah manfaat utama yang direncanakan tercapai.

Program Life Cycle

Program Definition

- **Program Formulation** adalah tahap penyusunan business case program yang menjelaskan manfaat utama program untuk mendukung inisiatif strategis organisasi. Pada tahap ini, organisasi menunjuk program sponsor yang bertugas mengawasi program, memastikan pendanaan, dan memilih program manager.
- **Program Planning**
Program planning dimulai setelah program charter disetujui, dengan membentuk struktur tata kelola, organisasi awal, dan tim untuk menyusun program management plan, yaitu dokumen utama yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pengendalian program guna memastikan kinerja proyek terkelola dengan baik dan program tetap selaras dengan strategi organisasi sehingga manfaat yang diharapkan dapat tercapai.

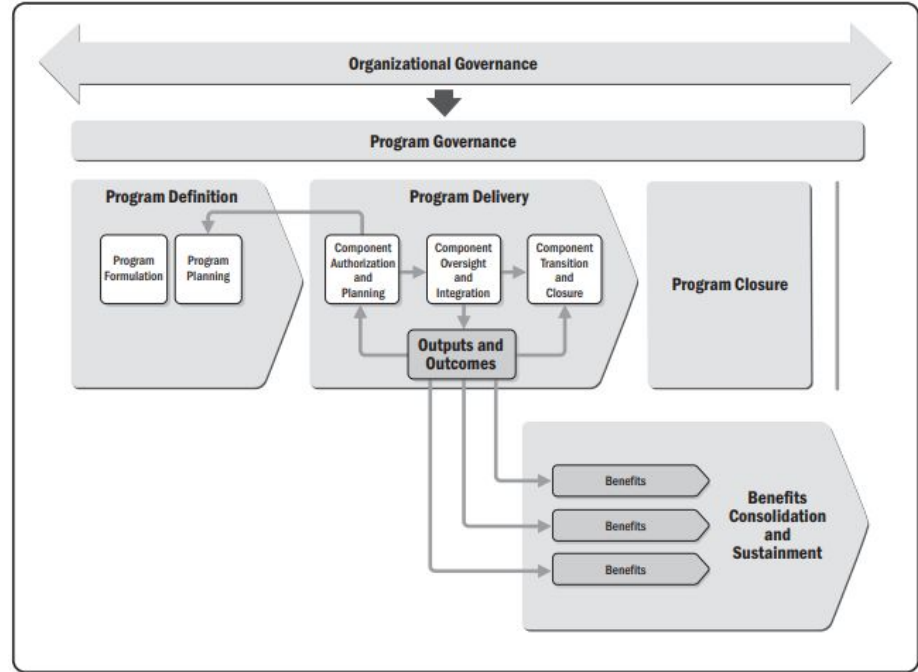


Figure 1-1. Program Life Cycle

Program Life Cycle

Program Delivery

- **Component Authorization and Planning**
Component authorization adalah proses persetujuan dan inisiasi komponen program berdasarkan kriteria dan business case agar selaras dengan strategi dan tujuan program. Component planning dilakukan untuk mengintegrasikan komponen ke dalam program serta menetapkan ruang lingkup dan hasil kerja agar komponen dapat berjalan efektif dan mendukung manfaat program.
- **Component Oversight and Integration**
Dalam program, ada komponen yang langsung menghasilkan manfaat, sementara komponen lain baru memberi manfaat jika terintegrasi dengan komponen lain. Setiap tim komponen menjalankan rencananya dan melaporkan progres kepada program manager agar seluruh pekerjaan terkoordinasi. Dalam beberapa kasus, program manager dapat membentuk komponen baru untuk menyatukan upaya integrasi, karena tanpa koordinasi yang baik, hasil komponen mungkin tercapai tetapi manfaat program tidak terwujud.

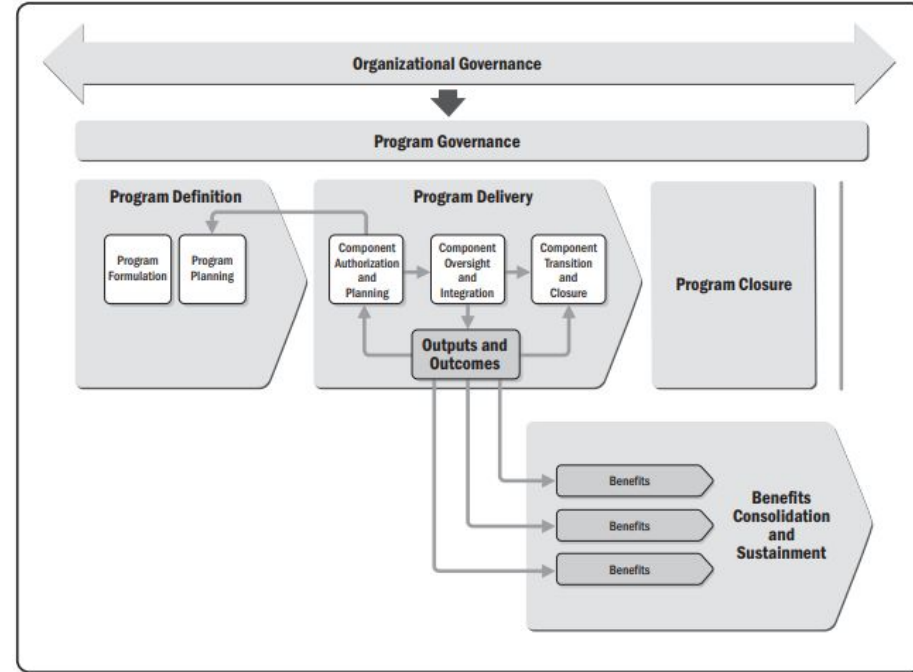


Figure 1-1. Program Life Cycle

Program Life Cycle

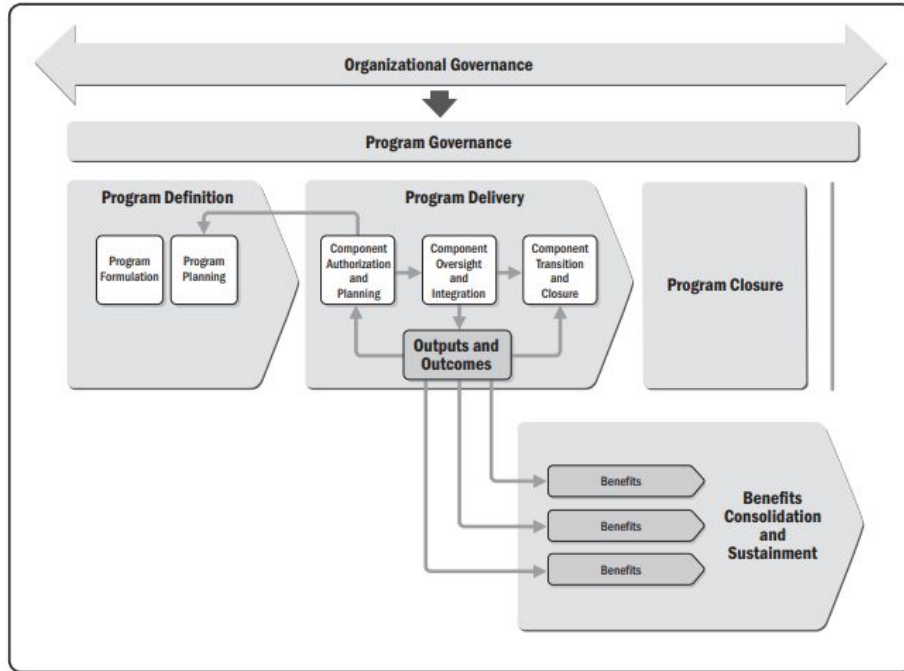


Figure 1-1. Program Life Cycle

Program Delivery

- **Component Transition and Closure**

Setelah komponen menghasilkan deliverables, dilakukan component transition, yaitu pengalihan komponen ke fungsi operasional agar dukungan produk, layanan, dan pengguna tetap berjalan sehingga manfaat program berkelanjutan sesuai rencana tata kelola. Menjelang akhir fase delivery, seluruh komponen kemudian memasuki program closure, dengan meninjau pencapaian manfaat, menyelesaikan atau mengalihkan sisa aktivitas, serta memperoleh persetujuan akhir dari program sponsor dan steering committee sebelum program ditutup secara resmi.

Program Life Cycle

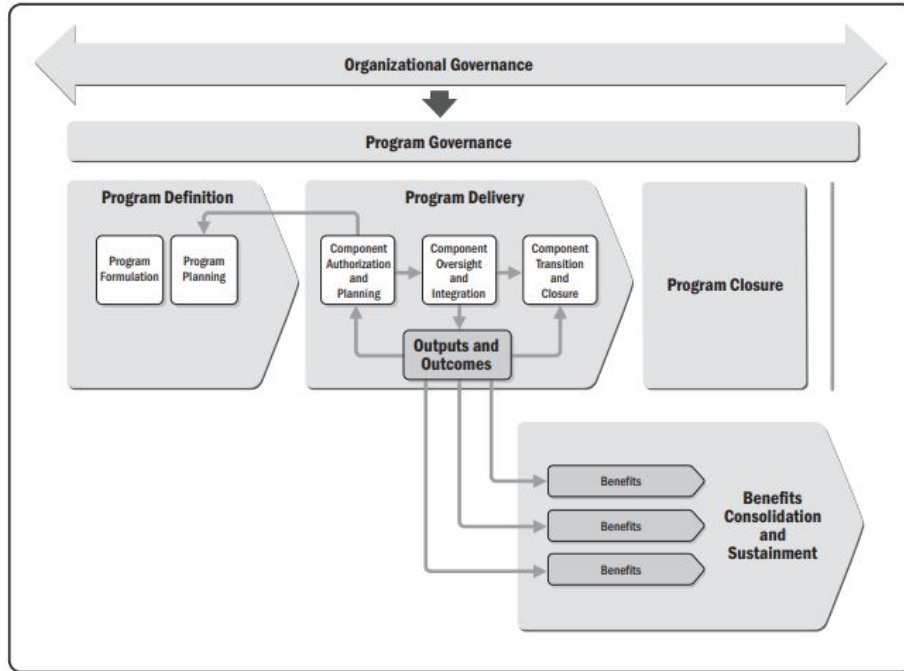


Figure 1-1. Program Life Cycle


Program Closure

Fase program closure mencakup aktivitas untuk mentransisikan manfaat program ke organisasi operasional dan menutup program secara formal dan terkendali. Pada tahap program transition, steering committee menilai apakah seluruh manfaat telah tercapai dan transisi komponen selesai, atau apakah manfaat lanjutan akan dikelola oleh program atau unit lain. Jika dialihkan, maka sumber daya, tanggung jawab, pengetahuan, dan lessons learned ditransisikan. Setelah seluruh transisi selesai, program manager memperoleh persetujuan sponsor untuk menutup program secara resmi.

Program Life Cycle - Program Benefit Management

Program Benefits Management adalah mengidentifikasi, mengelola, memantau, dan memastikan manfaat program selaras dengan tujuan strategis organisasi. **Program Benefits Management** membantu organisasi memastikan bahwa investasi program memberikan nilai nyata dan berkelanjutan bagi organisasi.

Benefits Identification : Identifikasi manfaat yang diharapkan dari suatu program. Informasi Rencana Strategis, Program Charter dan Business Case dianalisis untuk memastikan manfaat program selaras dengan tujuan organisasi. Benefit identification meliputi penetapan tujuan program dan faktor keberhasilan utama, serta mengidentifikasi dan memperkirakan manfaat bisnis.

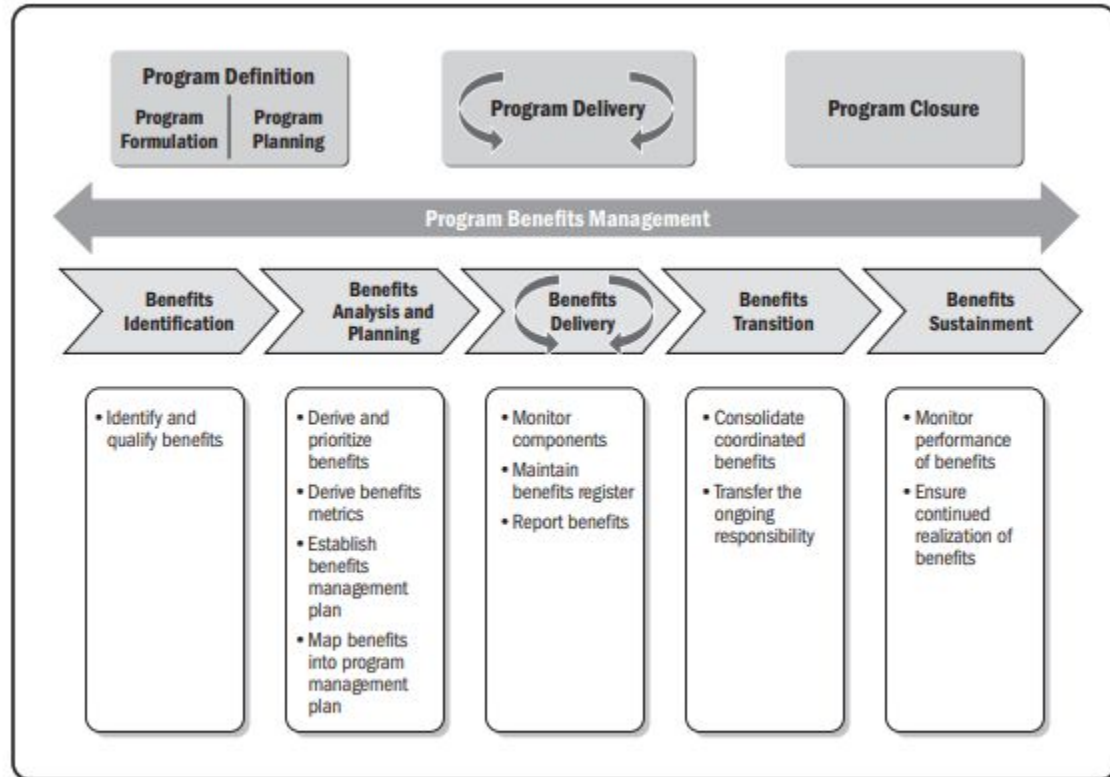


Program Life Cycle - Program Benefit Management

Benefits Analysis and Planning merupakan tahap untuk merencanakan secara detail bagaimana manfaat diukur, dipantau dan diwujudkan.


Benefits Delivery merupakan tahap untuk memastikan bahawa program menghasilkan manfaat, memantau manfaat tercapai dan memberikan nilai bagi organisasi.

Benefit Transition merupakan tahap memastikan bahawa hasil program tidak berhenti di akhir proyek dan jadi bagian operasional yang berkelanjutan memberikan nilai bagi organisasi.

Benefit Sustainment merupakan tahap untuk memastikan bahawa manfaat program tidak berhenti setelah program ditutup namun dipelihara, dipantau dan dikembangkan agar tetap bernilai.

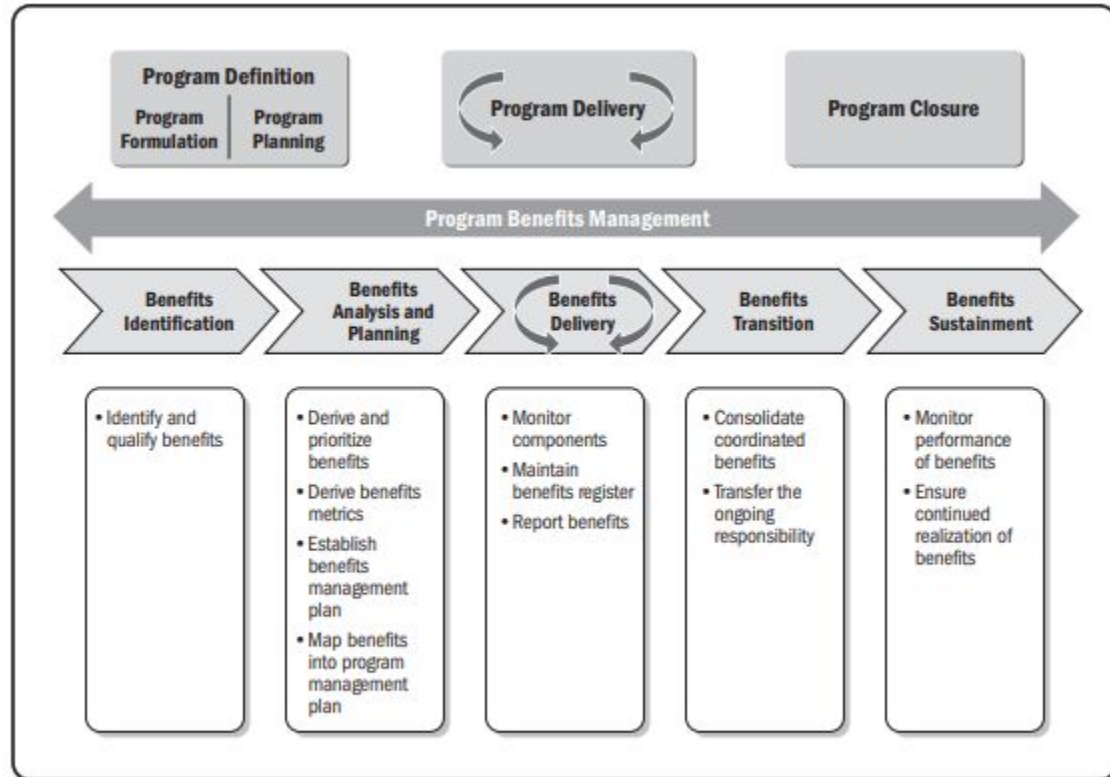

Program Life Cycle Phases

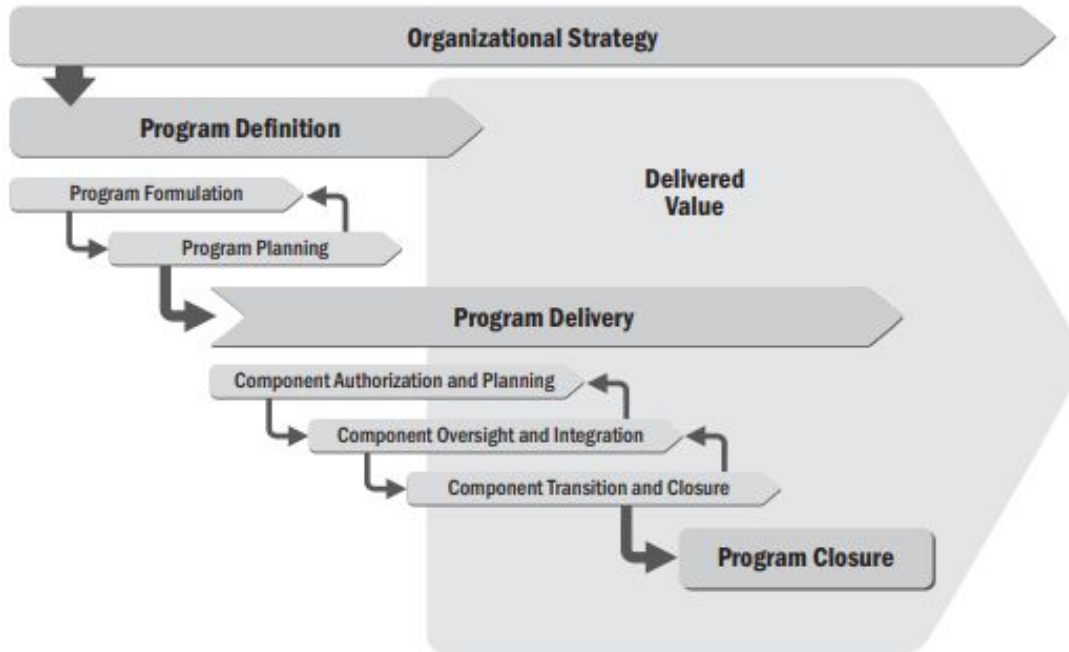

Program Definition merupakan phase pengesahan program serta penyusunan business case, business charter dan roadmap.

Program Formulation: Memastikan program memiliki business case, business charter dan roadmap.

Program Planning: Menyusun tata kelola dan program management plan

Program Delivery merupakan phase untuk memastikan seluruh komponen program dilaksanakan secara terintegrasi untuk menghasilkan kapabilitas dan manfaat yang direncanakan.

Component authorization and planning: Memastikan setiap komponen disetujui

Component oversight and integration: pengawasan koordinasi pelaksanaan komponen

Component transition and closure: Proses penutupan atau transisi komponen ke operasional

Program Closure merupakan phase yang menjamin manfaat program ditransisikan ke organisasi operasional.


Governance Hierarchy

Portfolio governance menetapkan arah strategis, kebijakan, dan keputusan investasi TI.

Program Governance menerjemahkan strategi menjadi manfaat terukur melalui koordinasi dan integrasi berbagai komponen.

Project mengeksekusi inisiatif TI dan menghasilkan solusi/layanan yang menjadi dasar pencapaian manfaat dan tujuan strategis organisasi.

- **Alur A** (Governance & Direction): berupa kebijakan, arahan, kontrol, integrasi, dan keputusan governance.
- **Alur B** (Control, Reporting & Escalation): berupa laporan kinerja, change request, serta eskalasi isu dan risiko.
- **Alur C** (Delivery & Output): berupa produk, layanan, atau kapabilitas yang berkontribusi langsung pada pencapaian manfaat.

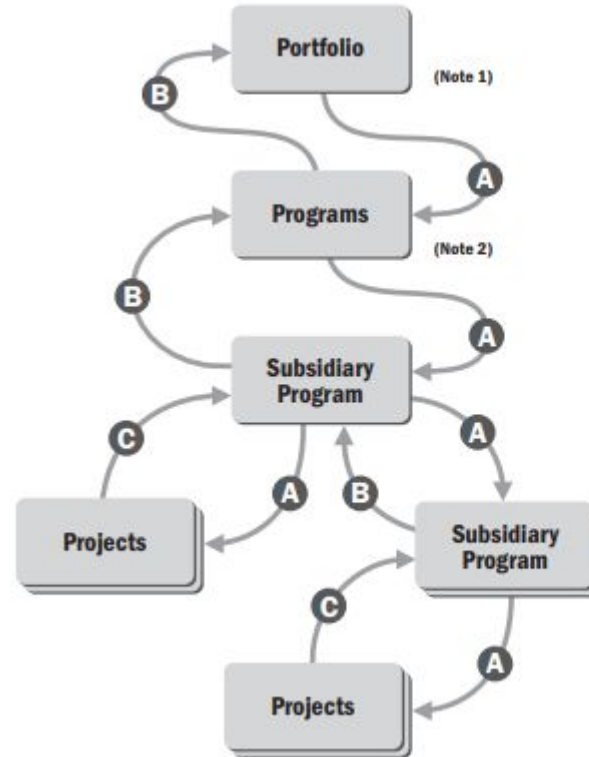

Note 1: The level above program governance may be governance at the portfolio level.

Note 2: Implemented via several roles (see Section 6.2).

Project

Project merupakan kegiatan sementara yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, baik berupa produk, layanan, maupun hasil yang unik. Dilakukan untuk memenuhi tujuan dengan menghasilkan deliverables

- **Tujuan** : hasil atau posisi yang ingin dicapai, termasuk produk atau layanan yang ingin dihasilkan
- **Deliverables** : produk atau hasil yang dapat diverifikasi dan dihasilkan untuk menyelesaikan suatu proses, fase atau project



Project

Project membawa perubahan dalam organisasi. Dari sudut pandang bisnis, project bertujuan untuk memindahkan organisasi dari satu kondisi ke kondisi lain.

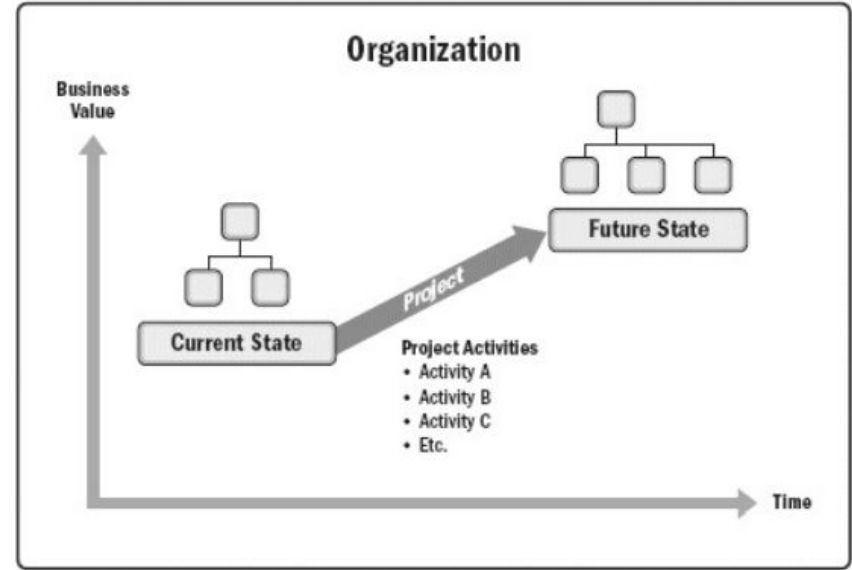


Figure 1-1. Organizational State Transition via a Project

Portfolio, Programs, Projects, and Operations

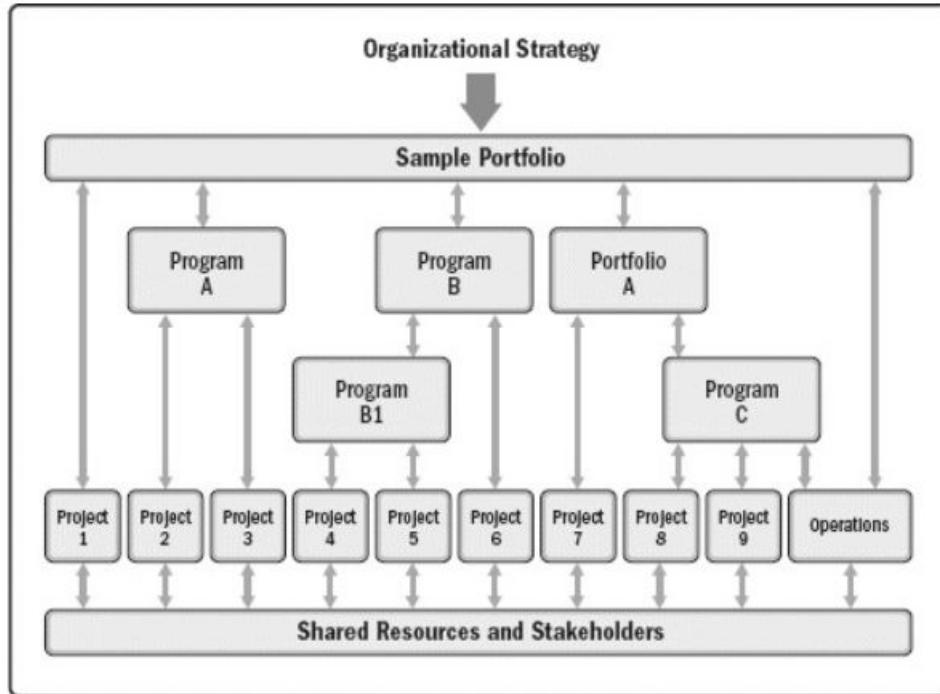


Figure 1-3. Portfolio, Programs, Projects, and Operations

Dalam sudut pandang organisasi:

- **Project and program management**, berfokus pada bagaimana menjalankan project dan program dengan benar
- **Portfolio management**, berfokus pada memilih project dan program yang paling tepat

Project Life Cycle

Project Life Cycle merupakan serangkaian fase yang dilalui project sejak dimulai hingga selesai. Siklus ini menyediakan kerangka kerja yang dapat berlaku untuk semua jenis project. Fase dalam project dapat bersifat berurutan, berulang, atau saling tumpang tindih.

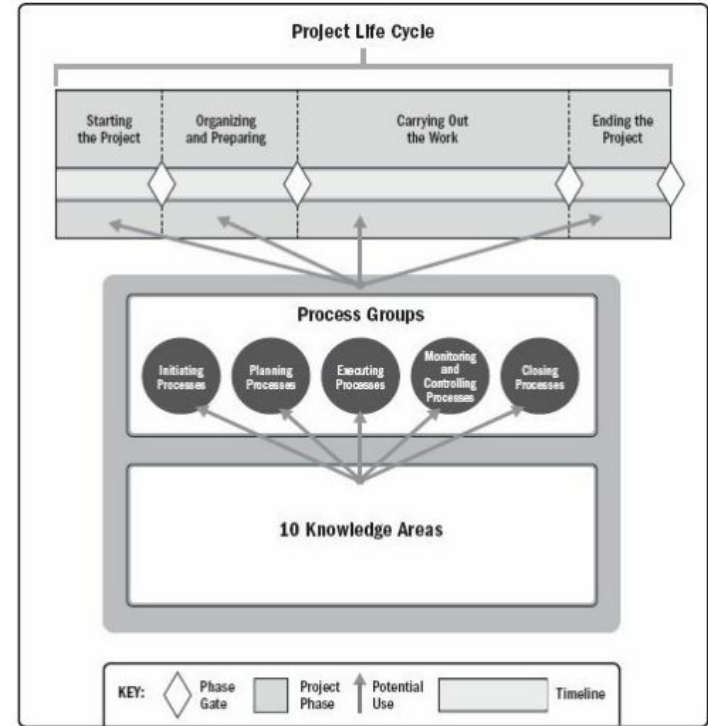


Figure 1-5. Interrelationship of PMBOK® Guide Key Components in Projects

Project Life Cycle

Project Phase adalah kumpulan aktivitas yang saling terkait dan menghasilkan satu atau lebih deliverable, dengan karakteristik khusus yang membedakan setiap fase.

Phase Gate adalah titik evaluasi di akhir fase project.

Project Management Process Groups adalah kumpulan proses yang digunakan untuk mencapai tujuan project, dan tidak terikat pada fase project.

Knowledge Areas adalah bidang project management yang berisi kumpulan proses, praktik, serta alat dan teknik untuk mengelola aspek tertentu dalam project

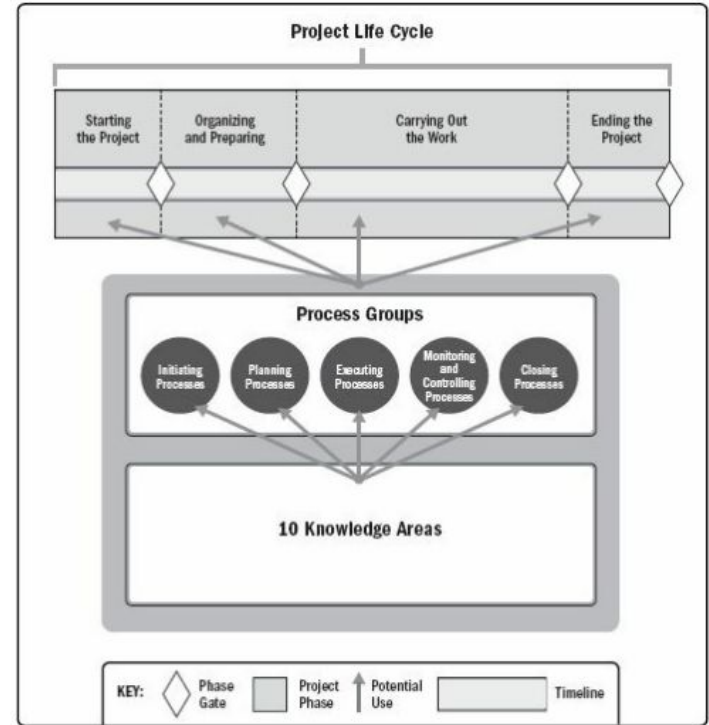


Figure 1-5. Interrelationship of PMBOK® Guide Key Components in Projects

10 Knowledge Areas

1. **Project Integration Management**
Koordinasi seluruh proses dan aktivitas manajemen project
2. **Project Scope Management**
Memastikan pekerjaan project sesuai kebutuhan yang ditetapkan
3. **Project Schedule Management**
Mengelola penyelesaian project tepat waktu
4. **Project Cost Management**
Merencanakan dan mengendalikan biaya sesuai anggaran
5. **Project Quality Management**
Memastikan mutu project dan produk sesuai harapan pemangku kepentingan
6. **Project Resource Management**
Mengelola sumber daya untuk keberhasilan project
7. **Project Communications Management**
Mengelola informasi project secara efektif dan tepat waktu
8. **Project Risk Management**
Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko project
9. **Project Procurement Management**
Mengelola pengadaan dari pihak eksternal
10. **Project Stakeholder Management**
Mengelola keterlibatan dan ekspektasi pemangku kepentingan



Project Management Business Documents

Project Manager perlu memastikan bahwa pendekatan manajemen proyek mampu menangkap maksud dari dokumen-dokumen bisnis.

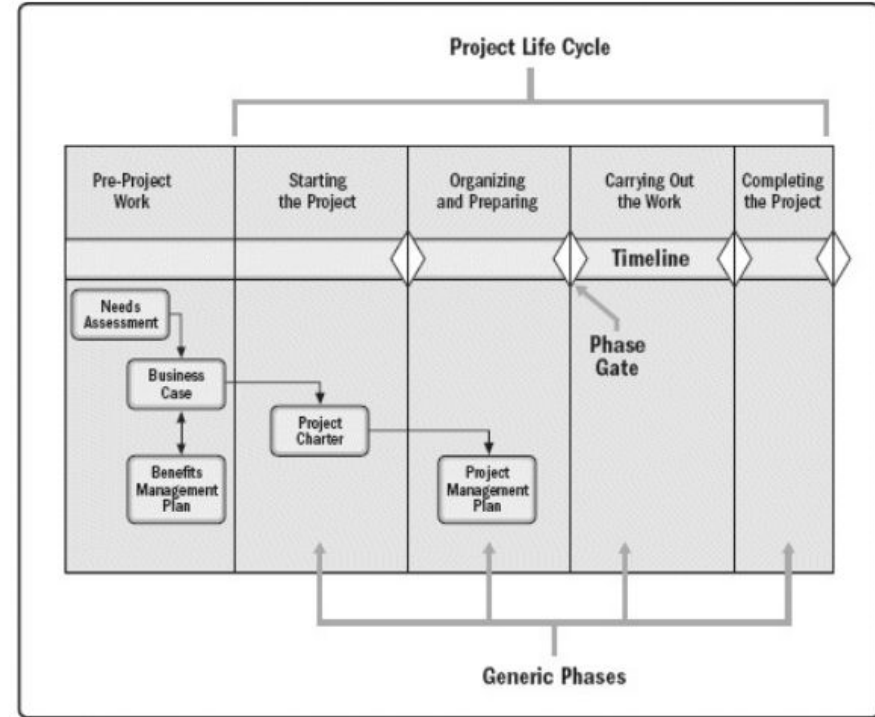


Figure 1-8. Interrelationship of Needs Assessment and Critical Business/Project Documents

Project Management Business Documents

- **Project Business Case**

Dokumen berbasis needs assessment yang menjelaskan alasan bisnis, biaya, dan manfaat proyek, serta digunakan sebagai dasar persetujuan atau penolakan pelaksanaan proyek.

- **Project Benefits Management Plan**

Dokumen yang menjelaskan manfaat proyek, waktu pencapaiannya, dan cara pengukurannya, yang disusun sejak awal proyek.

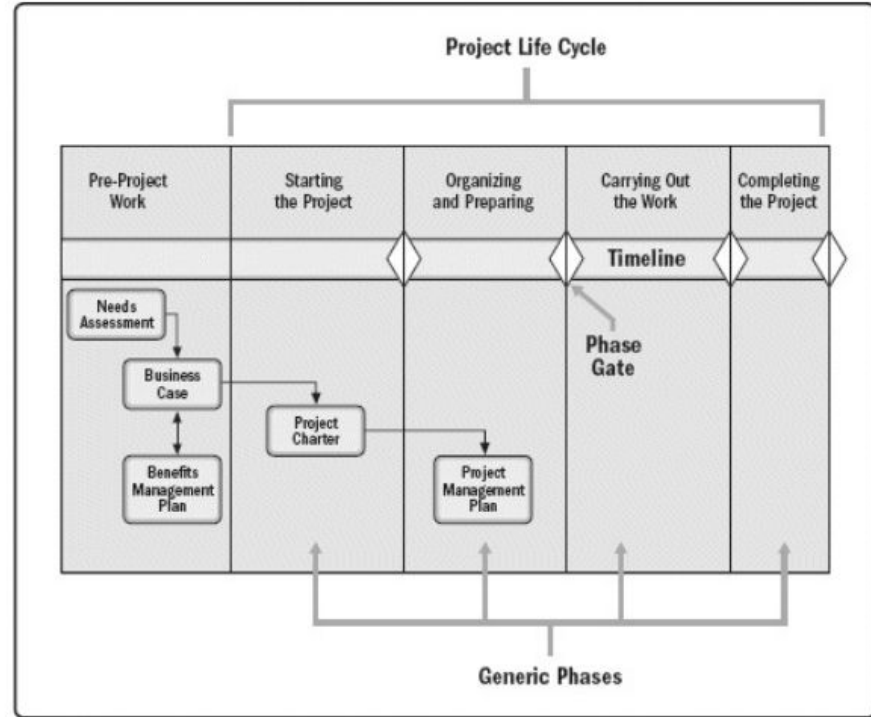


Figure 1-8. Interrelationship of Needs Assessment and Critical Business/Project Documents

Project Management Business Documents

- **Project Charter**

Dokumen resmi dari sponsor proyek yang menyatakan persetujuan proyek dan memberikan wewenang kepada project manager untuk menggunakan sumber daya organisasi.

- **Project Management Plan**

Dokumen yang menjelaskan cara pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek.


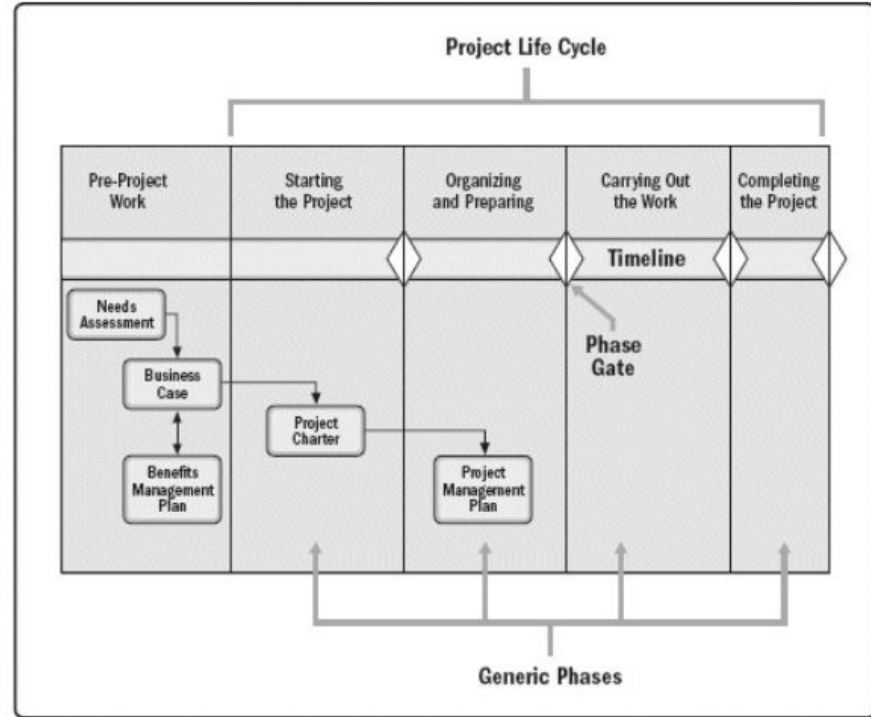


Figure 1-8. Interrelationship of Needs Assessment and Critical Business/Project Documents

.Flow Chart alur proses Work Program and Budget

6. Alur Proses

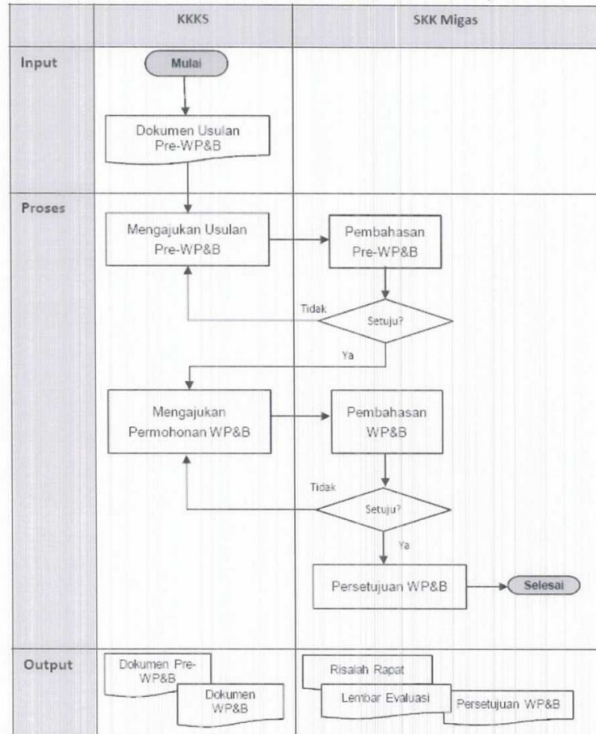

Tgl Pengajuan: 11 Feb 2026

Klaim No.: C-20260210-TTRINKAII001-N80DLU

Polis ini dibeli melalui PT Kereta Api Indonesia Persero

Asuransi Pembatalan Perjalanan - Kereta Api Indonesia



Nomor Polis
Dilindungi Oleh
Nomor Transaksi

T-TRIN-KAII-001-20260203-KXFLZ
MNC Insurance
212937193424414-ACCESS9034ZAP9HEV2

✓
Diajukan

✓
Pemeriksaan

●
Disetujui

4
Selesai



Dalam Tinjauan Asuransi

Lihat Detail


bikin begini bisa?

IT Strategic Plan Building Blocks

- 15 Ontrack
- 8 At risk
- 1 Not signed
- 7 Not started
- * 2 Inisiatif digabung

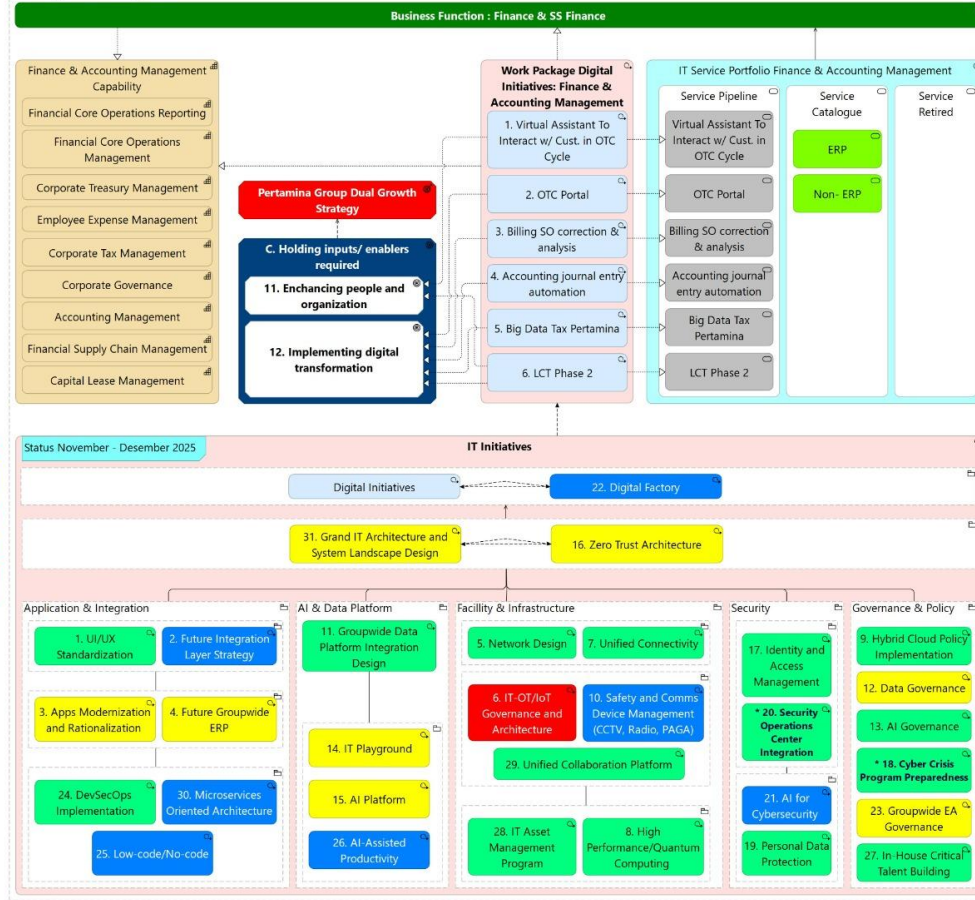

13 Perlunya Akselerasi IT Initiatives untuk mendukung Digital Initiatives

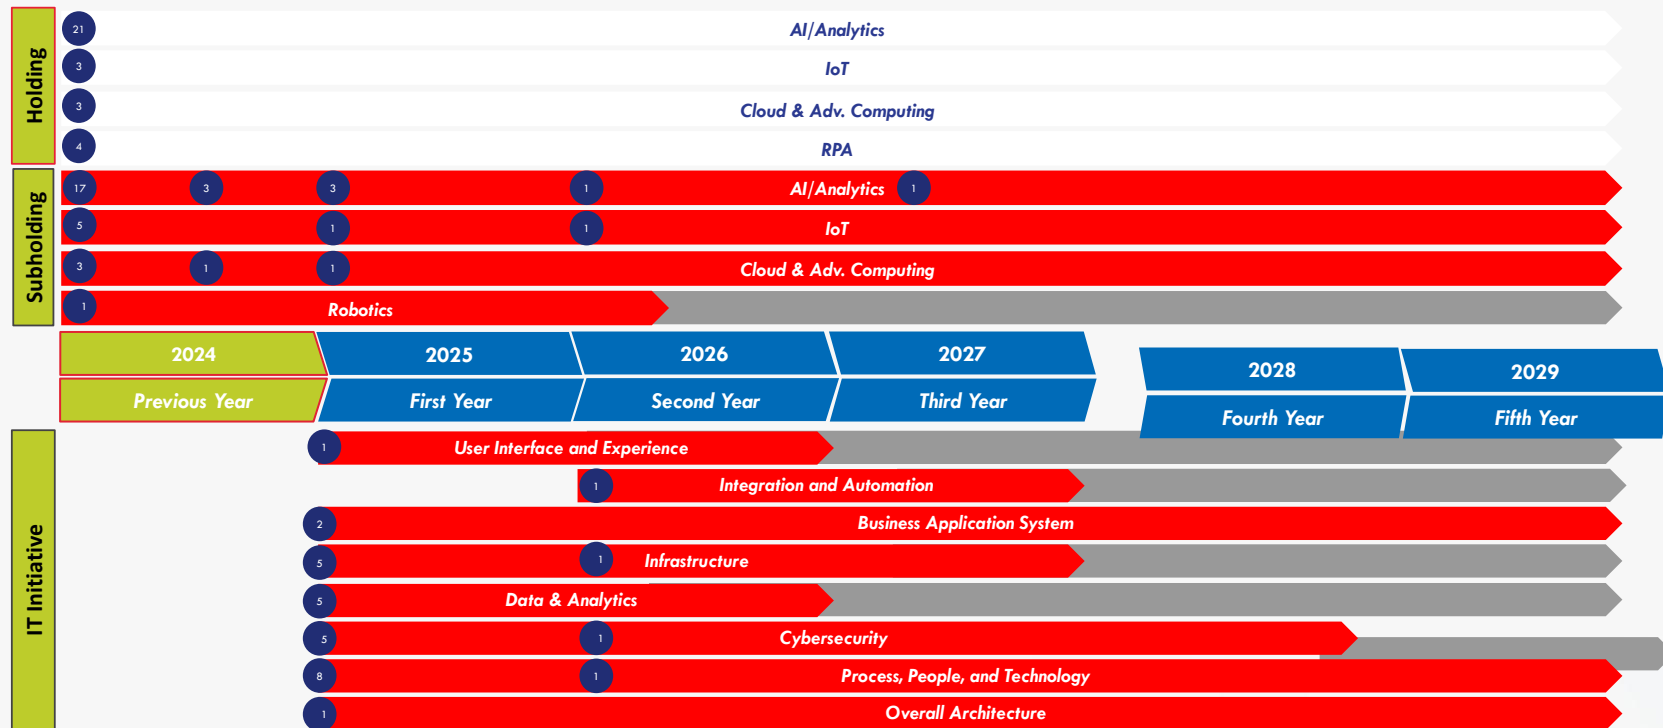

Analisis Tim berdasarkan data source: Rencana Strategis TI 2025-2029 Pertamina (Persero), 17 January 2025

Develop Project Charter

Develop Project Charter adalah proses untuk menyusun dokumen resmi yang mengesahkan keberadaan proyek dan memberi kewenangan formal kepada project manager untuk menggunakan sumber daya organisasi. Proses ini menghubungkan proyek secara langsung dengan tujuan strategis organisasi, mendokumentasikan komitmen manajemen, dan menjadi dasar pelaksanaan proyek. Penyusunannya memanfaatkan input seperti business case, benefits management plan, dan faktor lingkungan organisasi, dengan teknik seperti expert judgment, data gathering, dan facilitation.

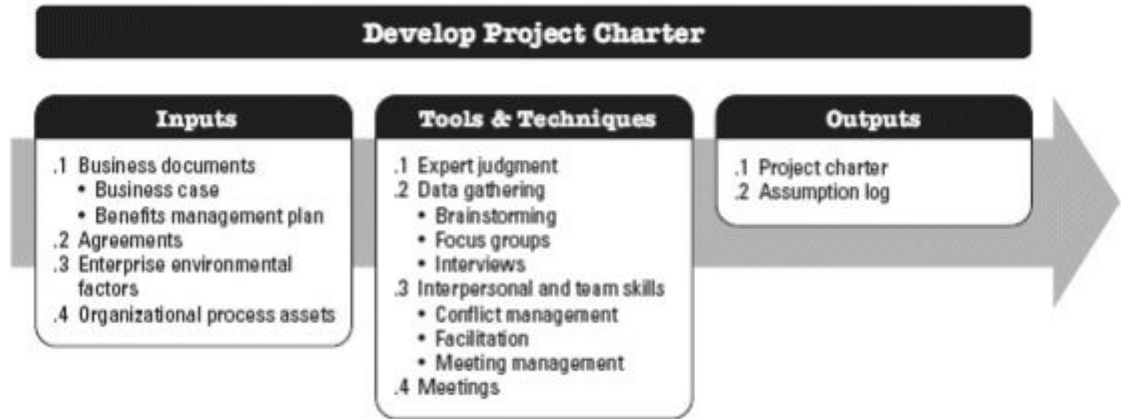


Figure 4-2. Develop Project Charter: Inputs, Tools & Techniques, and Outputs

Program Management

Program Management merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan prinsip untuk mencapai tujuan program serta menghasilkan manfaat. Fokus utama program management adalah penyelarasan dan koordinasi komponen program agar manfaat dapat disampaikan secara optimal.

Program Management dijalankan oleh **Program Manager** yang diberi kewenangan organisasi untuk memastikan tujuan dan manfaat strategis tercapai.



Project Management

Project Management merupakan penerapan pengetahuan , keterampilan, alat, dan teknik untuk memastikan proyek memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Fokus utama project management adalah penyampaian output dan outcome secara efisien dalam batasan waktu, biaya, dan spesifikasi. Project Management mencakup pengelolaan kebutuhan, pemangku kepentingan, komunikasi, sumber daya, serta keseimbangan antara ruang lingkup, jadwal, biaya, mutu, dan risiko.

Project Management dijalankan oleh **Project Manager** untuk memimpin tim yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan proyek.



Project Management

Project management yang efektif membantu individu, kelompok, serta organisasi publik dan swasta untuk:

- Mencapai tujuan bisnis
- Memenuhi harapan pemangku kepentingan
- Menjadi lebih dapat diprediksi
- Meningkatkan peluang keberhasilan
- Menghasilkan produk yang tepat pada waktu yang tepat
- Menyelesaikan masalah dan isu
- Merespons risiko secara tepat waktu
- Mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi
- Mengidentifikasi, memulihkan atau menghentikan project yang gagal
- Mengelola kendala
- Menyeimbangkan pengaruh antar kendala project
- Mengelola perubahan dengan cara yang lebih baik

Project yang dikelola dengan buruk atau ketiadaan **project management** dapat mengakibatkan:

- Keterlambatan penyelesaian
- Pembengkakan biaya
- Kualitas yang buruk
- Pekerjaan ulang
- Perluasan ruang lingkup project yang tidak terkendali
- Hilangnya reputasi organisasi
- Pemangku kepentingan yang tidak puas, dan
- Gagalnya pencapaian tujuan yang menjadi dasar pelaksanaan project



Project Management Information System

Project Management Information System (PMIS) adalah sistem berbasis TI yang menyediakan seperangkat alat terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek. PMIS mencakup perangkat lunak penjadwalan untuk menyusun dan memperbarui jadwal proyek, alat estimasi dan pengendalian biaya, manajemen sumber daya (perencanaan, alokasi, utilisasi, dan koordinasi tim), manajemen risiko, serta sistem komunikasi dan kolaborasi.

PMIS juga berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan, menyimpan, memantau, dan mendistribusikan informasi proyek termasuk KPI, laporan kinerja, dashboard, dan komunikasi pemangku kepentingan secara tepat waktu dan terstandar guna mendukung pengambilan keputusan proyek.



Project Management Tools

Project Management Tools adalah alat, metode, dan sistem yang digunakan untuk merencanakan, memonitor, mengendalikan, dan menutup proyek agar sesuai dengan scope, waktu, biaya, kualitas, dan risiko yang telah ditetapkan.

Project management tools digunakan untuk: Perencanaan proyek, Pengendalian waktu & biaya, Monitoring dan pelaporan progres, Manajemen risiko & isu, Koordinasi tim & stakeholder dan Dokumentasi dan knowledge management proyek.

Penggunaan project management tools yang terstandarisasi membantu organisasi untuk:

- Meningkatkan tingkat keberhasilan proyek
 - Mengurangi keterlambatan dan pemborosan biaya
 - Menyediakan data real-time untuk manajemen
 - Mendukung tata kelola dan audit proyek
 - Menjadi fondasi penerapan Project Portfolio Management (PPM)
- 

Project Management Tools

Project Management Tools Berdasarkan fungsi:

Tools Perencanaan:

- Work Breakdown Structure (WBS)
- Gantt Chart
- Network Diagram
- Critical Path Method (CPM)
- Resource Planning Matrix

Tools Pengendalian Waktu & Biaya:

- Earned Value Management (EVM)
- Schedule Variance (SV)
- Cost Variance (CV)
- Forecasting (EAC, ETC)
- Milestone Tracking

Tools Manajemen Risiko:

- Risk Register
- Risk Matrix (Probability vs Impact)
- Issue Log
- Root Cause Analysis

Tools Monitoring, Reporting & Governance: Tools Kolaborasi & Komunikasi:

- Project Dashboard
- Progress Report
- KPI Proyek
- Change Log & Change Control
- RACI Matrix
- Stakeholder Register
- Communication Plan
- Meeting Minutes (MoM)



Project Management Tools - Application

Kategori	Fitur	Jira	Trello	ClickUp
A. Tools Perencanaan (Planning Tools)	Work Breakdown Structure (WBS)	✓	✓	✓
	Gantt Chart	✓*	✗	✓
	Network Diagram	✗	✗	✗
	Critical Path Method (CPM)	✗	✗	✗
	Resource Planning Matrix	✓*	✗	✓
B. Tools Pengendalian Waktu & Biaya	Earned Value Management (EVM)	✓*	✗	✗
	Schedule Variance (SV)	✓*	✗	✗
	Cost Variance (CV)	✓*	✗	✗
	Forecasting (EAC, ETC)	✓*	✗	✗
	Milestone Tracking	✓	✓	✓

Project Management Tools - Application

Kategori	Fitur	Jira	Trello	ClickUp
C. Tools Manajemen Risiko & Isu	Risk Register	✓ ^c	✓ ^c	✓
	Risk Matrix (Probability vs Impact)	✗	✗	✗
	Issue Log	✓	✓	✓
	Root Cause Analysis	✗	✗	✓ ^c
D. Tools Kolaborasi & Komunikasi	RACI Matrix	✗	✗	✓ ^c
	Stakeholder Register	✗	✗	✓ ^c
	Communication Plan	✗	✗	✓ ^c
	Meeting Minutes (MoM)	✓ ^c	✓ ^c	✓

Project Management Tools - Application

Kategori	Fitur	Jira	Trello	ClickUp
E. Tools Monitoring, Reporting & Governance	Project Dashboard	✓	✓*	✓
	Progress Report	✓	✗	✓
	KPI Proyek	✓*	✗	✓
	Change Log & Change Control	✓ ^c	✗	✓ ^c



Hubungan Program Management & Project Management

Program Management dan Project Management memiliki hubungan kolaboratif dan saling bergantung untuk mewujudkan manfaat organisasi.

Program Manager menetapkan arah strategis dan mengkoordinasikan ketergantungan antara project

Project Manager mengatur pelaksanaan dan pengendalian aktivitas proyek.

Program Manager dan **Project Manager** berkolaborasi mencakup penyelarasan strategi, pemantauan kinerja, pengelolaan risiko, serta transisi output dan outcome proyek agar manfaat program dapat direalisasikan.



Project Management Office

Project Management Office (PMO) adalah struktur organisasi yang menstandarkan tata kelola terkait proyek serta memfasilitasi berbagi sumber daya, metodologi, alat, dan teknik. Tanggung jawab PMO dapat mencakup fungsi pendukung manajemen proyek hingga pengelolaan langsung satu atau lebih proyek.




Project Management Office

Terdapat beberapa jenis Project Management Office (PMO) dalam organisasi, berdasarkan tingkat kendali dan pengaruhnya terhadap proyek:

- **Supportive PMO**
Memberikan peran konsultatif dengan menyediakan template, praktik terbaik, pelatihan, akses informasi, dan lesson learned. Berfungsi sebagai repositori proyek dengan tingkat kendali rendah.
- **Controlling PMO**
Memberikan dukungan sekaligus mewajibkan kepatuhan terhadap standar, seperti penggunaan metodologi manajemen proyek, template, alat, dan kerangka tata kelola. Memiliki tingkat kendali sedang.
- **Directive PMO**
Mengelola proyek secara langsung, di mana manajer proyek ditugaskan oleh dan melapor kepada PMO. Memiliki tingkat kendali tinggi.




Program Strategy Alignment

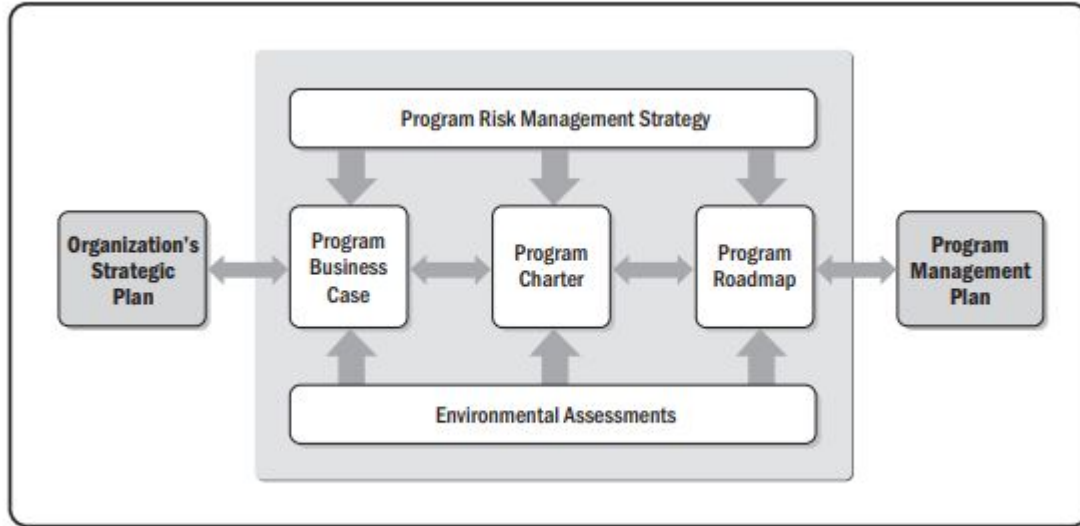

Program Strategy Alignment memastikan seluruh proyek dalam program selaras dengan tujuan strategis organisasi dan manfaat yang ingin dicapai.

Program manager bertanggung jawab menyelaraskan rencana proyek individu dimulai dari penyusunan **program business case** sebagai dasar kelayakan manfaat, yang kemudian diturunkan ke **program charter** dan **program roadmap**.

Program Charter

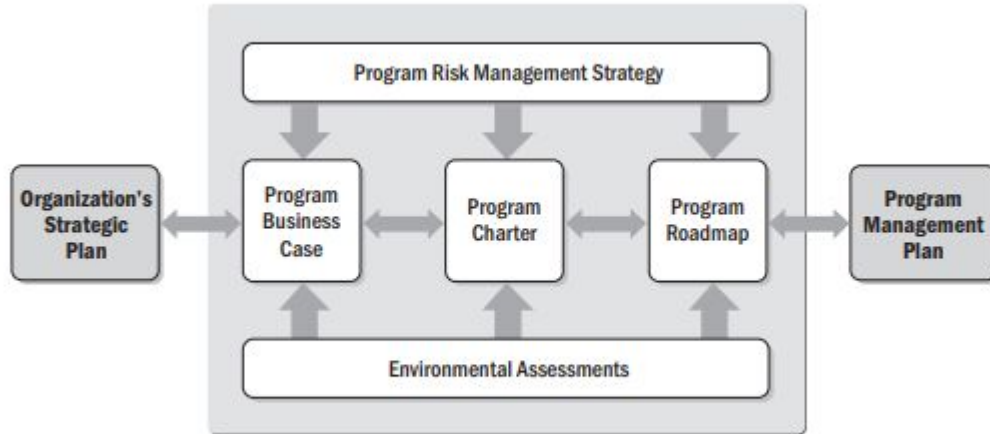


Program Charter merupakan dokumen resmi bahwa program sudah disetujui dan akan dijalankan. Program Charter dibuat setelah business case disetujui dan menunjuk program manager serta menetapkan tujuan dan ruang lingkup program serta memberikan wewenang dan pendanaan.

Program Charter menjelaskan tujuan program, manfaat yang ingin dicapai, batasan dan asumsi, risiko utama, pihak-pihak yang terlibat dan memastikan program tetap selaras dengan strategi organisasi dan business case. Program Charter bertujuan untuk mengelola proyek dan menjadi acuan untuk mengukur keberhasilan program melalui kriteria dan matrix yang telah ditetapkan.

Program Roadmap

Program Roadmap merupakan gambaran rencana besar program dalam garis waktu untuk menunjukkan arah program, tahapan utama, garis waktu pelaksanaan program dan manfaat program

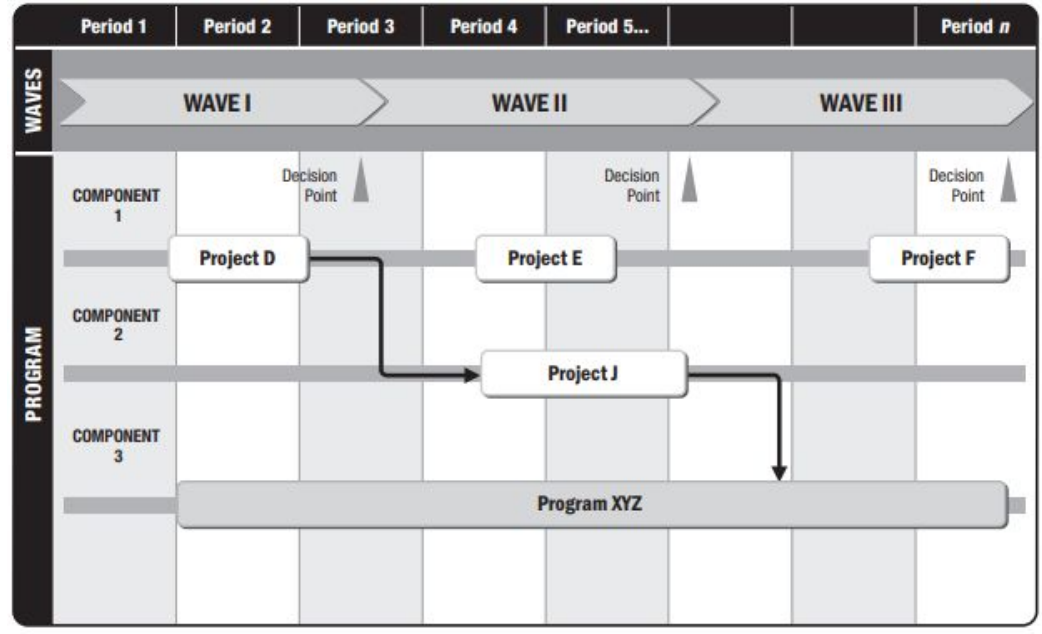

Keterkaitan Portfolio, Program, dan Project

Portfolio mengelola dan menyelaraskan project, program, dan operasi agar sesuai dengan strategi organisasi serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya

Program mengoordinasikan project-project terkait dan mengelola ketergantungannya untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar

Project melaksanakan pekerjaan secara terencana untuk mencapai tujuan dan menghasilkan deliverable tertentu



References

- PMBOK GUIDE SIXTH EDITION :
<https://trainupinstitute.com/wp-content/uploads/2022/03/Project-Management-Institute-A-Guide-to-the-Project-Management-Body-of-Knowledge-PMBOK%C2%AE-Guide%E2%80%936th-Edition-Project-Management-Institute-2017.pdf>
- THE STANDARD FOR PROGRAM MANAGEMENT FOURTH EDITION: [THE STANDARD FOR PROGRAM MANAGEMENT – FOURTH EDITION](#)




Program, Project, Portfolio Menurut COBIT 2019

BAI01 - Managed Program

- **Deskripsi:** Mengelola seluruh program dari portofolio investasi agar selaras dengan strategi perusahaan dan terkoordinasi dengan baik, berdasarkan pendekatan manajemen program yang standar. Memulai, merencanakan, mengendalikan, dan melaksanakan program, serta memantau nilai yang diharapkan dari program tersebut.
- **Tujuan:** Mewujudkan nilai bisnis yang diinginkan dan mengurangi risiko terjadinya keterlambatan, biaya, serta penurunan nilai yang tidak terduga. Untuk mencapai hal tersebut, meningkatkan komunikasi serta keterlibatan pihak bisnis dan pengguna akhir, memastikan nilai dan kualitas hasil (deliverables) program serta tindak lanjut proyek-proyek di dalam program, dan memaksimalkan kontribusi program terhadap portofolio investasi.



BAI01 - Managed Program (Practices)

- BAI01.01 - Maintain a standard approach for program management
 - BAI01.02 - Initiate a program
 - BAI01.03 - Manage stakeholder engagement
 - BAI01.04 - Develop and maintain the program plan
 - BAI01.05 - Launch and execute the program
 - BAI01.06 - Monitor, control and report on the program outcomes
 - BAI01.07 - Manage program quality
 - BAI01.08 - Manage program risk
 - BAI01.09 - Close a program
- 

BAI01 - Managed Program (Organizational)

B. Component: Organizational Structures for BAI01 — Managed Programs

Key Management Practice	Chief Executive Officer	Chief Risk Officer	Chief Information Officer	I&T Governance Board	Business Process Owners	Steering (Programs/Projects) Committee	Program Manager	Project Management Office	Head Architect	Head Development	Head IT Operations
BAI01.01 Maintain a standard approach for program management.	A		R	R			R				
BAI01.02 Initiate a program.		R			R	A	R	R			
BAI01.03 Manage stakeholder engagement.					R	A	R	R			
BAI01.04 Develop and maintain the program plan.						A	R	R			
BAI01.05 Launch and execute the program.			R		R	A	R	R			
BAI01.06 Monitor, control and report on the program outcomes.			R			A	R	R	R	R	R
BAI01.07 Manage program quality.					R	A	R	R			
BAI01.08 Manage program risk.		R			R	A	R	R		R	
BAI01.09 Close a program.			R		R	A	R	R		R	

Related Guidance

No related guidance for this component

Detailed Reference

BAI11 - Managed Project

- **Deskripsi:** Mengelola seluruh proyek yang diinisiasi di dalam organisasi agar selaras dengan strategi perusahaan dan terkoordinasi dengan baik berdasarkan pendekatan manajemen proyek yang standar. Memulai, merencanakan, mengendalikan, dan melaksanakan proyek, serta menutupnya dengan melakukan tinjauan pasca-implementasi.
- **Tujuan:** Mewujudkan hasil proyek yang telah ditetapkan dan mengurangi risiko terjadinya keterlambatan, biaya, serta penurunan nilai yang tidak terduga dengan meningkatkan komunikasi serta keterlibatan pihak bisnis dan pengguna akhir. Memastikan nilai dan kualitas hasil (deliverables) proyek serta memaksimalkan kontribusinya terhadap program yang telah ditetapkan dan portofolio investasi.



BAI11 - Managed Project (Practices)

- BAI11.01 - Maintain a standard approach for project management
- BAI11.02 - Start up and initiate a project
- BAI11.03 - Manage stakeholder engagement
- BAI11.04 - Develop and maintain the project plan
- BAI11.05 - Manage project quality
- BAI11.06 - Manage project risk
- BAI11.07 - Monitor and control projects
- BAI11.08 - Manage project resources and work packages
- BAI11.09 - Close a project or iteration



BAI11 - Managed Project (Organizational)

B. Component: Organizational Structures for BAI11 — Managed Projects											
Key Management Practice	Chief Executive Officer	Chief Risk Officer	Chief Information Officer	Chief Technology Officer	Business Process Owners	Steering (Programs/Projects) Committee	Program Manager	Project Manager	Project Management Office	Head Development	Information Security Manager
BAI11.01 Maintain a standard approach for project management.	A		R					R	R		
BAI11.02 Start up and initiate a project.		R		R	R	A	R	R	R	R	
BAI11.03 Manage stakeholder engagement.			R			A		R			
BAI11.04 Develop and maintain the project plan.						A		R	R		
BAI11.05 Manage project quality.		R	R			A		R			R
BAI11.06 Manage project risk.			R			A		R			R
BAI11.07 Monitor and control projects.					R	A		R	R	R	
BAI11.08 Manage project resources and work packages.					R	A	R		R	R	
BAI11.09 Close a project or iteration.						A		R	R		
Related Guidance						Detailed Reference					
No related guidance for this component.											

AP005 - Managed Portfolio

- **Deskripsi:** Melaksanakan arah strategis yang telah ditetapkan untuk investasi agar selaras dengan visi arsitektur perusahaan serta peta jalan (road map) I&T. Mempertimbangkan berbagai kategori investasi serta keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Mengevaluasi, memprioritaskan, dan menyeimbangkan program serta layanan, dengan mengelola permintaan dalam batasan sumber daya dan pendanaan, berdasarkan keselarasan dengan tujuan strategis, nilai bagi perusahaan, dan risiko. Memindahkan program yang terpilih ke dalam portofolio produk atau layanan aktif untuk dieksekusi. Memantau kinerja keseluruhan portofolio produk, layanan, dan program, serta mengusulkan penyesuaian yang diperlukan sebagai respons terhadap kinerja program, produk, atau layanan maupun perubahan prioritas perusahaan.
- **Tujuan:** Mengoptimalkan kinerja keseluruhan portofolio program sebagai respons terhadap kinerja masing-masing program, produk, dan layanan, serta terhadap perubahan prioritas dan permintaan perusahaan.



AP005 - Managed Portfolio

- **Deskripsi:** Melaksanakan arah strategis yang telah ditetapkan untuk investasi agar selaras dengan visi arsitektur perusahaan serta peta jalan (road map) I&T. Mempertimbangkan berbagai kategori investasi serta keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Mengevaluasi, memprioritaskan, dan menyeimbangkan program serta layanan, dengan mengelola permintaan dalam batasan sumber daya dan pendanaan, berdasarkan keselarasan dengan tujuan strategis, nilai bagi perusahaan, dan risiko. Memindahkan program yang terpilih ke dalam portofolio produk atau layanan aktif untuk dieksekusi. Memantau kinerja keseluruhan portofolio produk, layanan, dan program, serta mengusulkan penyesuaian yang diperlukan sebagai respons terhadap kinerja program, produk, atau layanan maupun perubahan prioritas perusahaan.
- **Tujuan:** Mengoptimalkan kinerja keseluruhan portofolio program sebagai respons terhadap kinerja masing-masing program, produk, dan layanan, serta terhadap perubahan prioritas dan permintaan perusahaan.



APO05 - Managed Portfolio (Practices)

- APO05.01 - Determine the availability and source of funds
- APO05.02 - Evaluate and select program to fund
- APO05.03 - Monitor, optimize and report on investment portfolio performance
- APO05.04 - Maintain portfolios
- APO05.05 - Manage benefits achievement



APO05 - Managed Portfolio (Organizational)

B. Component: Organizational Structures for APO05 — Managed Portfolio									
Key Management Practice	Chief Financial Officer	Chief Information Officer	Chief Technology Officer	Chief Digital Officer	I&T Governance Board	Business Process Owners	Portfolio Manager	Program Manager	Project Management Office
APO05.01 Determine the availability and sources of funds.	R	R			A		R		
APO05.02 Evaluate and select programs to fund.	R	R	R	R	A		R	R	
APO05.03 Monitor, optimize and report on investment portfolio performance.		R	R	R	A		R	R	
APO05.04 Maintain portfolios.		R	R	R	A		R	R	R
APO05.05 Manage benefits achievement.	R	R	R	R	A	R	R	R	
Related Guidance					Detailed Reference				
No related guidance for this component									
